GOKWORKS · Nesting ve sac maliyeti

Proje: GOKWORKS · Kontur yerleşimi örneği
Rapor zamanı (UTC): 2026-10-20T06:10:05.617818+00:00
Motor: GOKWORKS NFP 1.0

Bağımsız geometri kontrolü geçti. En iyi bulunan sonuçtur; optimum garantisi yoktur.

Üretim özeti

Parça adedi	**22**	Kullanılan levha	**1**
Brüt ağırlık kg	**3.768**	Net ağırlık kg	**2.11533**
Fire ağırlığı kg	**1.65267**	Fire %	**43.86**
Alan verimi %	**56.14**	Kontur / piercing adedi	**38**
Kesim uzunluğu m	**8.13577**	Hesap birimi	**mm; kg; TL**

Maliyet özeti

Malzeme maliyeti TL	**169.56**	Net malzeme karşılığı TL	**95.19**
Fire malzeme karşılığı TL	**74.37**	Kesim TL	**0.00**
Piercing TL	**0.00**	Hazırlık TL	**0.00**
Sabit gider TL	**0.00**	Kâr TL	**0.00**
KDV TL	**0.00**		

Genel toplam TL: 169.56

Parça özeti

GW-001

Malzeme / kalınlık	**S235JR / 2 mm**	Adet	**6**
Tek parça kg	**0.24021**	Toplam kg	**1.44126**
Net alan mm² / adet	**15300.000**	Dağıtılmış malzeme TL	**115.50**

Levhalar: 1. plaka · 600 × 400

GW-002

Malzeme / kalınlık	**S235JR / 2 mm**	Adet	**10**
Tek parça kg	**0.05003**	Toplam kg	**0.50031**
Net alan mm² / adet	**3186.667**	Dağıtılmış malzeme TL	**40.10**

Levhalar: 1. plaka · 600 × 400

GW-003

Malzeme / kalınlık	**S235JR / 2 mm**	Adet	**6**
Tek parça kg	**0.02896**	Toplam kg	**0.17377**
Net alan mm² / adet	**1844.651**	Dağıtılmış malzeme TL	**13.96**

Levhalar: 1. plaka · 600 × 400

Yerleşim ayarları ve hesap notları

Kenar payı mm	**10**	Bitmiş parça aralığı mm	**3**
Kerf mm	**0.2**	Hadde yönü	**Parça bazlı / serbest**

Kerf: Nominal kontur; CAM kesim yolu telafisi uygulanmadı. Mesafe max(aralık, kerf) + eğri hata payları. Aynalama ve delik içi yerleşim desteklenmez.

Maliyet dağıtımı: Her levhanın satın alma bedeli, yerleşen parçaların net alanı oranında dağıtılır; toplam kuruşu kuruşuna korunur.

Kalıntılar: Delikler dahil bütün boş alan fire/kalan alanıdır. Yeniden kullanım veya hurda kredisi düşülmedi.

Süre tahmini: Hesaplanmaz. Kesim ve piercing bedelleri girilen birim fiyatlardan gelir.

Malzeme yoğunlukları

Malzeme	Yoğunluk kg/m³
S235JR	7850

Yoğunluklar yaklaşık başlangıç değerleridir. Kaynak kayıtları proje dosyasında ve Excel raporunun Malzemeler sayfasında korunur.

Geometri doğrulama bilgisi

GW-001: eğri toleransı 0 mm; uç toleransı 0.001 mm; gerçek uç hareketi 0 mm.
Kaynak SHA256: 173fe0fe9c8d21a901013b90125b43e41ce5f04a2a520c49abc57a3f56990b5d

GW-002: eğri toleransı 0.02 mm; uç toleransı 0.001 mm; gerçek uç hareketi 0 mm.
Kaynak SHA256: f26f4649a4ff62b6013ac31a812f94c8df3ca95f44c5a7c478f988eee2fc1874

GW-003: eğri toleransı 0.02 mm; uç toleransı 0.001 mm; gerçek uç hareketi 4.28626e-15 mm.
Kaynak SHA256: adc1b70c849eb539cd184e7e97c5b41b1becd430208cf13882b2d54a068d3aee

Yerleşen örnekler

Malzeme ve kalınlık parça özetindedir. Plaka numaraları çizim sayfalarıyla aynıdır. Maliyet, levha malzeme bedelinin örneğe ayrılan payıdır.

Parça / örnek	Plaka	Net kg	Net alan mm²	Malzeme TL
GW-001 #1	1	0.24021	15300.000	19.25
GW-001 #2	1	0.24021	15300.000	19.25
GW-001 #3	1	0.24021	15300.000	19.25
GW-001 #4	1	0.24021	15300.000	19.25
GW-001 #5	1	0.24021	15300.000	19.25
GW-001 #6	1	0.24021	15300.000	19.25
GW-002 #1	1	0.05003	3186.667	4.01
GW-002 #2	1	0.05003	3186.667	4.01
GW-002 #3	1	0.05003	3186.667	4.01
GW-002 #4	1	0.05003	3186.667	4.01
GW-002 #5	1	0.05003	3186.667	4.01
GW-002 #6	1	0.05003	3186.667	4.01
GW-002 #7	1	0.05003	3186.667	4.01
GW-002 #8	1	0.05003	3186.667	4.01
GW-002 #9	1	0.05003	3186.667	4.01
GW-002 #10	1	0.05003	3186.667	4.01
GW-003 #1	1	0.02896	1844.651	2.32
GW-003 #2	1	0.02896	1844.651	2.32
GW-003 #3	1	0.02896	1844.651	2.32
GW-003 #4	1	0.02896	1844.651	2.32
GW-003 #5	1	0.02896	1844.651	2.32
GW-003 #6	1	0.02896	1844.651	2.36

1. plaka · 600 × 400 · S235JR · 600 × 400 × 2 mm
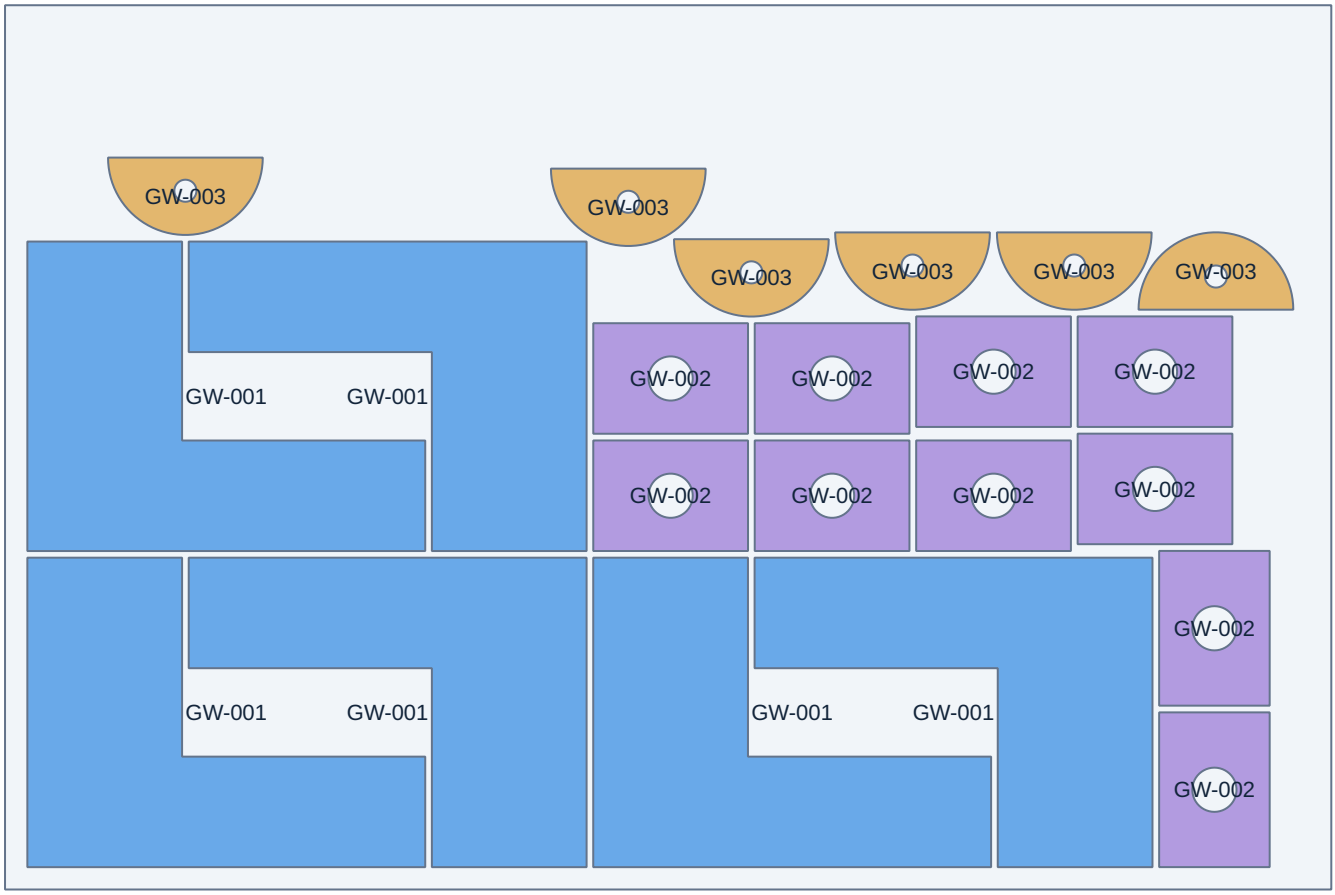
Brüt 3.76800 kg · Net 2.11533 kg · Fire 1.65267 kg
Verim %56.14 · Malzeme 169.56 TL · TL/kg 45
Nominal kesim konturları; kerf telafisi CAM/tezgâhta uygulanır.
